



Seguimiento de proyecto

Sutara Facundo
Acotto Valentin
Pereira Francisco
Castelo Matias
Gomez Juan
Aronna Mateo
Moyano Joaquin

Índice

Propósito del documento.....	3
Gestión de Sprints.....	4
Sprint o:.....	4
Working Agreement:.....	4
Definición de sprints:.....	5
Capacidad del equipo:.....	6
Definición de Roles del Equipo:.....	7
Tecnologías para el Desarrollo del Producto:.....	8
Capacitación del equipo.....	11
Definición de listo (DoR) de una user story.....	15
Definition of Done (DoD) de una user story.....	15
Product Backlog (inicial):.....	16
Story Map:.....	21
Historial de cambios.....	24

Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo servir como la guía operativa y el registro de trazabilidad para la ejecución y seguimiento continuo del proyecto. Bajo el marco metodológico Scrum, se detallan la asignación de roles, responsabilidades y los acuerdos de trabajo del equipo. Su propósito principal es visibilizar el avance incremental del sistema a lo largo del ciclo de vida del proyecto, documentando desde las definiciones iniciales en el Sprint o, hasta la planificación, ejecución y retrospectiva de cada Sprint, asegurando la identificación temprana de desviaciones y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Gestión de Sprints

Sprint 0:

Fecha inicio: 29/08/2026

Working Agreement:

El equipo de trabajo, conformado por siete integrantes, establece el presente Working Agreement con el objetivo de definir las normas de comunicación, colaboración, organización y calidad que regirán el desarrollo del proyecto. Estas pautas buscan facilitar el trabajo conjunto, mantener una comunicación fluida y asegurar que las actividades realizadas durante cada sprint se encuentren alineadas con los objetivos del producto.

Comunicación del equipo:

Canales de comunicación:

- Whatsapp: comunicación diaria y seguimiento rápido de actividades.
- Discord: reuniones del equipo, principalmente Sprint Planning, Sprint Review y otras reuniones que requieran comunicación por voz.

Horarios y tiempo de respuesta esperado:

- Lunes a Domingo, de 10:00 a 23:00
- Tiempo de respuesta esperado: alrededor de 30 minutos

Trabajo colaborativo:

Herramientas:

- Google docs: Elaboración de las documentaciones.
- Google drive: documentación y archivos compartidos.
- Jira: administración del Product Backlog, historias de usuario, tareas y seguimiento de los sprints.
- Github: control de versiones, almacenamiento del código fuente y gestión de Pull Requests.

Herramientas de modelado:

- draw.io: elaboración colaborativa de diagramas y modelos del sistema.
- miro: elaboración colaborativa de conceptos y diagramas en tiempo real

Definición de sprints:

El desarrollo se organizará en sprints de acuerdo a la metodología Scrum, con sprints de 2 semanas de duración, lo que permite contar con por lo menos 5 sprints de desarrollo, más una semana final de cierre e integración. En cada sprint se llevarán a cabo los eventos de Planning, seguimiento periódico diario (Daily), Review y Retrospectiva, detallados a continuación.

Eventos:

Evento	Recurrencia	Duración	Cómo	Con qué
Sprint planning	Bi-Semanal	1 hora	Llamada a través de Discord	Product Backlog priorizado (Jira)
Daily	Diaria	-	Mensajes asincrónicos cortos a través de Whatsapp	Canal de comunicación
Weekly	Semanal	30 min	Llamadas cortas a través de Discord	Canal de comunicación o vocería
Sprint review	Bi-semanal	30 min	Llamada a través de Discord	Google drive y repositorio en GitHub
Retrospectiva	Bi-semanal	30 min	Reunión al cierre de cada sprint	Formato simple: "qué funcionó / qué no / qué mejoramos"

Las reuniones de Sprint planning, se realizaran en los días sábados, además las sprint review y retro se realizarán también los sábados al final del sprint

Capacidad del equipo:

A fin de planificar de forma realista la carga de trabajo de cada sprint, se releva a continuación la disponibilidad horaria semanal de cada uno de los siete integrantes del equipo, considerando su compatibilidad con el cursado de otras materias y demás actividades.

Integrante	Horas semanales disponibles	Horas por sprint
Accotto Valentin	19	38
Aronna Mateo	18	36
Castelo Matias	17	34
Gomez Juan Cruz	17	34
Moyano Joaquin	18	36
Pereira Francisco	20	40
Sutara Facundo	20	40

Definición de Roles del Equipo:

Aunque durante el desarrollo del proyecto distintos integrantes tendrán distinta cantidad de carga, y el trabajo será distribuido de forma pareja entre el equipo, asignamos roles de Scrum y participantes que serán los encargados de las actividades, tanto de realización principal como de revisión:

Product Owner:

- Sutura, Facundo

Scrum master: Este rol se asignará a partir del sprint 1, y rotará entre los siguientes participantes, a modo de un participante en el rol por sprint:

- Castelo, Matías

El equipo de desarrollo se dividirá en áreas:

- **Análisis de negocio:**
 - Sutura, Facundo
- **Analistas de sistemas:**
 - Sutura, Facundo
- **Arquitectura:**
 - Castelo, Matías
- **Diseñador UX/UI:**
 - Castelo, Matías
- **Frontend:**
 - Accotto, Valentín
 - Moyano, Joaquín
- **Backend:**
 - Aronna, Mateo
 - Gomez Toledo, Juan Cruz
 - Pereira, Francisco
- **Bases de Datos:**
 - Aronna, Mateo
- **Test/QA:**
 - Gomez Toledo, Juan Cruz

Document Owner:

- Castelo, Matías
- Sutura, Facundo
- Pereira, Francisco

Tecnologías para el Desarrollo del Producto:

Se define el stack tecnológico a utilizar para el desarrollo del producto "M&V Turnos", contemplando su implementación como aplicación web con arquitectura PWA (Progressive Web App), así como los criterios adoptados por el equipo para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo durante el desarrollo.

Frontend: React - Vite (con enfoque PWA)

Framework y librería	Descripción
React (v19.2.8)	Librería principal para la construcción de interfaces basada en componentes reactivos y gestión del Virtual DOM.
React DOM (v19.2.8)	Adaptador del Virtual DOM específico para el renderizado en navegadores web.
Vite (v8.2.2)	Entorno de desarrollo local de alto rendimiento y empaquetador de producción basado en Rollup.
vite-plugin-pwa (v1.3.0)	Motor PWA (Workbox) para generación de Service Workers, caché offline y configuración del Web App Manifest.
@vitejs/plugin-react (v6.1.0)	Plugin oficial para soporte de JSX y recarga rápida en caliente (Fast Refresh).
@types/react (v19.2.18)	Tipado estático y definiciones de tipos para el núcleo de React.
@types/react-dom (v19.2.5)	Tipado estático y definiciones de tipos para los métodos del DOM de React.
ESLint (v10.9.0)	Herramienta de análisis estático para garantizar la calidad del código y detectar errores de sintaxis.
@eslint/js (v10.0.1)	Conjunto de reglas base recomendadas por el equipo de ESLint.
eslint-plugin-react-hooks (v7.1.1)	Reglas de linting para asegurar el uso correcto de los React Hooks.
eslint-plugin-react-refresh (v0.5.4)	Reglas de linting para validar componentes compatibles con Fast Refresh.
globals (v17.11.0)	Diccionario de variables globales para el entorno de análisis de ESLint.

Backend:

Entorno, Framework y librería	Descripción
Node.js (v24.19.0)	Entorno de ejecución en servidor basado en el motor V8 de JavaScript, optimizado para operaciones de E/S no bloqueantes y arquitectura orientada a eventos.
Express.js (v5.2.1)	Framework web para la estructuración de endpoints RESTful, manejo de rutas y ejecución del pipeline de middlewares.
Nodemon (v3.1.14)	Herramienta de desarrollo que monitoriza el directorio del proyecto y reinicia automáticamente el proceso de Node ante cualquier modificación en el código fuente.

Base de datos: MySQL

Testing: JEST

Control de versiones: Git + GitHub

El equipo podrá utilizar herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en tareas de: generación de código boilerplate, redacción y revisión de documentación, generación de casos de prueba, y consulta de dudas técnicas puntuales. El uso de estas herramientas no reemplaza el criterio ni la responsabilidad del equipo sobre las decisiones de diseño, arquitectura y calidad del código, las cuales son siempre validadas y comprendidas por los integrantes antes de su incorporación al proyecto. Todo código generado con asistencia de IA es revisado mediante el proceso de Pull Request habitual del equipo.

Ningún segmento de código generado por agentes de inteligencia artificial alcanzará el producto de software final y en ningún caso tendrán acceso a datos sensibles tanto del negocio como de sus pacientes

Agentes de IA/LLM utilizados en el desarrollo:

- Claude
- Chat GPT
- Gemini

No verán ni usarán información sensible del sistema, solo como soporte.

Claude (El Arquitecto y Backend): Lo usamos para escribir la lógica de negocio pesada, diseñar las entidades de la base de datos, estructurar el código en capas limpias y resolver problemas complejos.

ChatGPT (Metodología y Documentación): Lo usamos para redactar las historias de usuario con sus criterios de aceptación, estructurar las entregas ágiles y armar la documentación funcional del proyecto.

Gemini (Comprensión y Análisis de Contexto): Lo usamos para procesar los textos largos del relevamiento, hacer resúmenes rápidos del dominio odontológico y explicar conceptos teóricos o técnicos que surgen durante el desarrollo.

Hosting: En cuanto a posibilidades de alojamiento dentro de los presupuestos establecidos por el profesional, tenemos en consideración las siguientes opciones que están en evaluación:

Servicio de alojamiento	Parte a alojar	Razón para consideración	Restricciones
Hetzner + Coolify	Frontend Backend MySQL	La opción más barata que cumple todos los RNF, 5 USD mensuales por 2 vCPU, 4 GB de RAM y 40 GB de disco, con 20 TB de tráfico incluidos.	el respaldo, las actualizaciones de seguridad y el monitoreo quedan a cargo del equipo, y eso es trabajo real que hay que planificar en un sprint.
Neon	Base de datos PostgreSQL	PostgreSQL serverless con capa gratuita de 0,5 GB y suspensión a cero cuando no hay actividad, pero con reanudación casi inmediata.	costo mensual de 19 USD y requiere usar PostgreSQL como motor de base de datos
Aiven	Base de datos MySQL o PostgreSQL	Es el único proveedor administrado relevado con una capa gratuita de MySQL (2 vCPU, 1 GiB).	El salto al plan pago es de 110 USD mensuales, así que sirve para el desarrollo, no como destino final.
Cloudflare Pages / Workers	Frontend (PWA)	Capa gratuita amplia (100.000 solicitudes diarias) y sin restricción de uso comercial	Si se quisiera mover la API, el runtime de Workers impone restricciones que obligarían a revisar el diseño

			del backend.
DigitalOcean	Backend MySQL	Base MySQL administrada con copias automáticas desde 15 USD mensuales, precio fijo y previsible.	-
Supabase	Base de datos PostgreSQL (+ Auth / Storage)	PostgreSQL administrado con capa gratuita (500 MB de base de datos, 1 GB de storage, 50.000 MAU y peticiones API ilimitadas). Plan de pago escalable desde 25 USD mensuales con opción de <i>spend caps</i> para evitar costos imprevistos.	Los proyectos gratuitos se pausan tras 1 semana de inactividad (máximo 2 proyectos activos). Exige PostgreSQL como motor de base de datos y los recursos de cómputo adicionales en planes superiores se tarifican por separado.

Capacitación del equipo

Llegamos a la conclusión de que todos tenemos conocimientos similares sobre el stack tecnológico que vamos a usar, sin embargo cada uno tiene su propio nivel de conocimiento por el aprendizaje autónomo de cada integrante y del rendimiento académico en materias como desarrollo de Software, base de datos, backend de aplicaciones, etc.

Definimos que la capacitación iniciará los días previos al inicio del sprint 1, planificado para el Domingo 13/09/2026, y se irá profundizando en las tecnologías a medida que veamos dificultades en el proceso de desarrollo o se noten faltas de conocimiento hasta el 27/09/2026 donde pasada esa fecha solo se consultaran e investigaran temas puntuales.

Como documentación y sitio de consulta general sobre las tecnologías a usar, utilizaremos la página “w3schools.com”, por la extensión de guías sobre tecnologías y herramientas que cubren todas las ponderadas en el proyecto. Además muchos conceptos y tecnologías relacionadas los tiene cada integrante en apuntes y notas de clases de las materias anteriores correspondientes.

Planificación:

Nivel de conocimiento y experiencia en los stacks, lenguajes, frameworks o librerías que vamos a usar:

Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Nulo

Integrante: Pereira Francisco

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
15/09/2026	Revisión y práctica de Javascript, Node y Express
17/09/2026	Revisión y práctica de React y MySql

Integrante: Acotto Valentin

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
11/09/2026	-Curso asincrónico de Node y MySQL.
12/09/2026	-Revisión y práctica con React. -Pruebas de testing con JEST.
13/09/2026	-Práctica de consultas MySQL

Integrante: Castelo Matias

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
09/09/2026	-Prácticas de Javascript/Express

11/09/2026	-Estudio inicial y capacitación de MYSQL
12/09/2026	-Lectura de documentación y comienzo de capacitación de JEST

Integrante: Aronna Mateo

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
07/09/2026	- Repaso de React
08/09/2026	- Revisión de JEST
13/09/2026	- Práctica de JEST

Integrante: Sutara Facundo

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
14/09/2026	Revisión de apuntes, documentación y ejercicios de las materias desarrollo de software y base de datos.
20/09/2026	– Práctica de JS y Node en: https://www.w3schools.com/js/default.asp https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp
21/09/2026	– Repaso de SQL con ejercicios del 1er cuatrimestre de 2026 en SQL Server Management Studio 20. – Práctica de React en: https://www.w3schools.com/react/default.asp
27/09/2026	– Interacción con sistema gestor de bases de datos “MYSQL” – Práctica de MYSQL en: https://www.w3schools.com/mysql/default.asp

Integrante: Gomez Juan

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
01/09/2026	Revisión y práctica de Node y Express en base a la documentación oficial y tutoriales varios de Youtube.
11/09/2026	Investigación, práctica y pruebas de testing con JEST.
15/09/2026	Revisión y práctica con React.

Integrante: Moyano Joaquin

JavaScript	SQL	Node	Express	MYSQL	React	JEST

Fecha de inicio	Capacitación
10/09/2026	-Prácticas de Node y Express.
12/09/2026	-Revisión y práctica con React. -Revisión y profundización de conocimientos de testing con JEST mediante tutoriales de Youtube.
15/09/2026	-Repaso de SQL y MYSQL

Para hacer un seguimiento de la capacitación quedará asignado el integrante Facundo Sutara como encargado para corroborar que el equipo cumpla con las capacitaciones establecidas en sus plazos definidos, y ajustar los planes en caso de demoras o contratiempos.

Definición de listo (DoR) de una user story

1. **Objetivo y alcance claros:** El equipo entiende qué hay que hacer y qué queda fuera (sin tareas sorpresa a mitad del camino).
2. **Criterios de aceptación definidos:** Tiene una lista corta de qué cosas tienen que funcionar para darla por buena y qué errores debe contemplar, casos de éxito y caso de fracaso.
3. **Datos y pantallas acordados:** Se sabe qué campos lleva el formulario, qué datos viajan al backend y cómo se ve la interfaz (con un boceto o acuerdo rápido).
4. **Sin dependencias bloqueantes:** Si necesita una tabla, una entidad o un endpoint previo, eso ya está terminado o claramente coordinado con quien lo hace.
5. **Tamaño alcanzable:** El equipo coincide en que se puede terminar y probar dentro del mismo Sprint sin quedar arrastrada para el siguiente.

Definition of Done (DoD) de una user story

1. **Funciona en cualquier máquina:** Se clona la rama, se levanta el proyecto y corre de una, usando solo la configuración estándar del repositorio.
2. **Manejo básico de errores:** Si un campo queda vacío o con datos incorrectos, el sistema muestra un mensaje claro y no se congela ni tira errores en blanco.
3. **Prueba manual de punta a punta:** Se probó el flujo completo: cargar el dato, guardarlo en la base y ver el resultado correcto en pantalla.
4. **Integración y regresión:** Los cambios fueron subidos al repositorio, revisados por otro integrante y se verificó que no generen errores o regresiones en las funcionalidades existentes.
5. **Listo para demo:** La funcionalidad se puede abrir en el navegador y mostrar en vivo sin fallar ante el docente o el equipo.

Product Backlog (inicial):

Se presenta el Product Backlog inicial del producto, organizado en épicas e historias de usuario derivadas de los requerimientos funcionales relevados, priorizadas según el criterio del equipo para el consultorio odontológico y ajustadas conforme a las observaciones realizadas por el profesor respecto al alcance del proyecto.

Épica P: Gestión de Pacientes (alta prioridad)

Permitir al odontólogo registrar, consultar y mantener organizada la información básica de sus pacientes definida en RF-03.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
P-1	Como odontólogo, quiero registrar un nuevo paciente para poder incorporarlo al sistema.	Alta
P-2	Como odontólogo, quiero registrar los datos personales y de contacto de un paciente para disponer de su información básica definida en RF-01.	Alta
P-3	Como odontólogo, quiero registrar una o más obras sociales de un paciente junto a sus respectivos números de afiliado, para disponer de su cobertura médica actualizada.	Alta
P-4	Como odontólogo, quiero consultar la información básica de un paciente definida en RF-01 para conocer sus datos antes de una atención.	Alta
P-5	Como odontólogo, quiero modificar los datos de un paciente para mantener actualizada su información.	Alta
P-6	Como odontólogo, quiero dar de baja lógicamente a un paciente para dejar de utilizarlo en nuevas gestiones sin eliminar su información histórica.	Media
P-7	Como odontólogo, quiero buscar un paciente por su DNI nombre o apellido para encontrarlo rápidamente.	Media
P-8	Como odontólogo, quiero consultar el saldo actual (deuda o saldo a favor) de un paciente para conocer su monto antes de la atención.	Alta

Épica T: Gestión de Turnos (Muy alta prioridad)

Permite administrar el ciclo de vida de los turnos, desde su creación hasta su cancelación o reprogramación.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
T-1	Como odontólogo, quiero crear un turno para registrar una nueva atención en mi agenda.	Muy alta
T-2	Como odontólogo, quiero seleccionar un paciente al crear un turno para asociar correctamente la atención.	Muy alta
T-3	Como odontólogo, quiero indicar la fecha, hora inicio y duración estimada del turno para establecer cuándo se realizará la atención.	Muy Alta
T-4	Como odontólogo, quiero que el sistema verifique la disponibilidad de horario para evitar solapamientos de turnos.	Muy alta
T-5	Como odontólogo, quiero re programar un turno para adaptarlo a cambios en la disponibilidad del paciente o del consultorio.	Alta
T-6	Como odontólogo, quiero cancelar un turno indicando el motivo para mantener actualizada mi agenda y conservar su historial.	Alta
T-7	Como odontólogo, quiero consultar mis turnos mediante filtros para encontrar rápidamente lo que busco.	Alta
T-8	Como odontólogo, quiero identificar el estado de un turno para saber si está programado, pendiente, cancelado, reprogramado o atendido.	Alta
T-9	Como odontólogo, quiero registrar rápidamente un turno indicando solamente los datos esenciales para poder agendar una cita con rapidez.	Media
T-10	Como odontólogo, quiero registrar un turno mediante audio para poder realizar una carga rápida cuando no pueda utilizar el teclado.	Media
T-11	Como odontólogo, quiero revisar y completar en pantalla los turnos generados por voz antes de confirmarlo en la agenda.	Media
T-12	Como odontólogo, quiero registrar la ausencia de un paciente para mantener actualizado el estado de la atención.	Alta

T-13	Como odontólogo, quiero registrar las prácticas efectivamente realizadas durante una atención para dejar constancia de lo realizado.	Alta
T-14	Como odontólogo, quiero modificar las prácticas efectivamente realizadas durante una atención para evitar errores que pueda cometer.	Alta
T-15	Como odontólogo, quiero asignar la obra social correspondiente que se usará en un turno.	Alta

Épica A: Agenda y Calendario (Alta prioridad)

Proporcionar una representación clara de la agenda del odontólogo y facilitar la consulta de sus turnos.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
A-1	Como odontólogo, quiero visualizar mi agenda diaria, semanal y mensual para conocer las atenciones programadas próximas.	Muy Alta
A-2	Como odontólogo, quiero distinguir visualmente los distintos niveles de ocupación de mi agenda mediante colores para identificar rápidamente su disponibilidad.	Media
A-3	Como odontólogo, quiero seleccionar un turno desde la agenda para consultar rápidamente su información.	Alta
A-4	Como odontólogo, quiero acceder a los datos básicos del paciente desde el turno seleccionado para disponer de la información necesaria antes de atenderlo.	Alta
A-5	Como odontólogo, quiero visualizar un panel diario con los turnos del día, incluyendo horario, paciente y práctica asociada.	Alta

Épica S: Seguimiento de Prácticas del Paciente (Prioridad media)

Permite consultar información histórica relacionada con las atenciones del paciente.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
S-1	Como odontólogo, quiero consultar el historial de turnos de un paciente para conocer sus atenciones anteriores.	Media
S-2	Como odontólogo, quiero registrar observaciones asociadas a una atención para dejar constancia de información relevante.	Alta

S-3	Como odontólogo, quiero consultar los detalles y notas asociadas a las atenciones anteriores para conocer la evolución del paciente.	Media
S-4	Como odontólogo, quiero acceder al historial de un paciente desde su ficha para consultar su información sin realizar búsquedas adicionales.	Media

Épica PR — Gestión de Prácticas (Prioridad alta)

Permitir administrar las prácticas odontológicas ofrecidas por el consultorio y asociarlas a los turnos.

ID -US	Historia de usuario	Prioridad
PR-1	Como odontólogo, quiero registrar una práctica odontológica indicando su código de nomenclador, nombre habitual, y valor de referencia, para incorporar al catálogo del consultorio.	Alta
PR-2	Como odontólogo, quiero modificar una práctica para mantener actualizado su valor o información.	Media
PR-3	Como odontólogo, quiero consultar las prácticas disponibles para seleccionar la correspondiente al atender un paciente.	Alta
PR-4	Como odontólogo, quiero dar de baja una práctica para que no esté disponible al agendar nuevos turnos sin afectar a los registros históricos.	Media

Épica C: Gestión de cobros (Prioridad media)

Proporcionar información resumida que permita al odontólogo conocer el estado de la actividad del consultorio y realizar un control básico de sus movimientos.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
C-1	Como odontólogo, quiero registrar un ingreso de dinero de un paciente indicando fecha, monto y método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta), para asentar pagos totales, entregas parciales o señas.	Alta
C-2	Como odontólogo, quiero asociar un costo pactado al tratamiento de un paciente para registrar su deuda inicial y establecer la base sobre la cual se irán descontando los pagos.	Alta

C-3	Como odontólogo, quiero consultar el balance del paciente (monto pactado acumulado vs. pagos recibidos) para conocer su deuda pendiente o saldo a favor sin calendarios rígidos de cuotas.	Alta
C-4	Como odontólogo, quiero registrar los gastos del consultorio indicando monto, concepto (alquiler, insumos, servicios) y descripción para llevar el control de salidas de dinero.	Media

Épica E: Resumen y Estadísticas (Prioridad media-baja)

En sprints posteriores se definirán más estadísticas.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
E-1	Como odontólogo, quiero consultar la cantidad de turnos atendidos, cancelados y ausentes durante un período determinado (diario, semanal o mensual) para conocer el nivel de actividad y ausentismo del consultorio.	Baja
E-2	Como odontólogo, quiero consultar un resumen de ingresos por cobros y salidas por egresos en un período (diario, semanal o mensual) para conocer el balance básico de caja sin cálculos complejos.	Media


Épica AS: Acceso y seguridad (Prioridad media)

Controlar el acceso al sistema para que permita que solo el odontólogo pueda acceder a esta.

ID - US	Historia de usuario	Prioridad
AS-1	Como odontólogo, quiero acceder al sistema mediante un PIN para resguardar la información de mis pacientes.	Alta
AS-2	Como odontólogo, quiero que la sesión se cierre automáticamente después de un período de inactividad para evitar que otra persona pueda acceder a la información del consultorio si dejo el dispositivo sin utilizar.	Media

Story Map:

El Story map definido a continuación es la representación de la evolución que nos imaginamos en una primera instancia del producto sprint a sprint, por lo que hay actividades y tareas que pueden cambiar de nombre, de prioridad o redefinirse durante el desarrollo del proyecto.

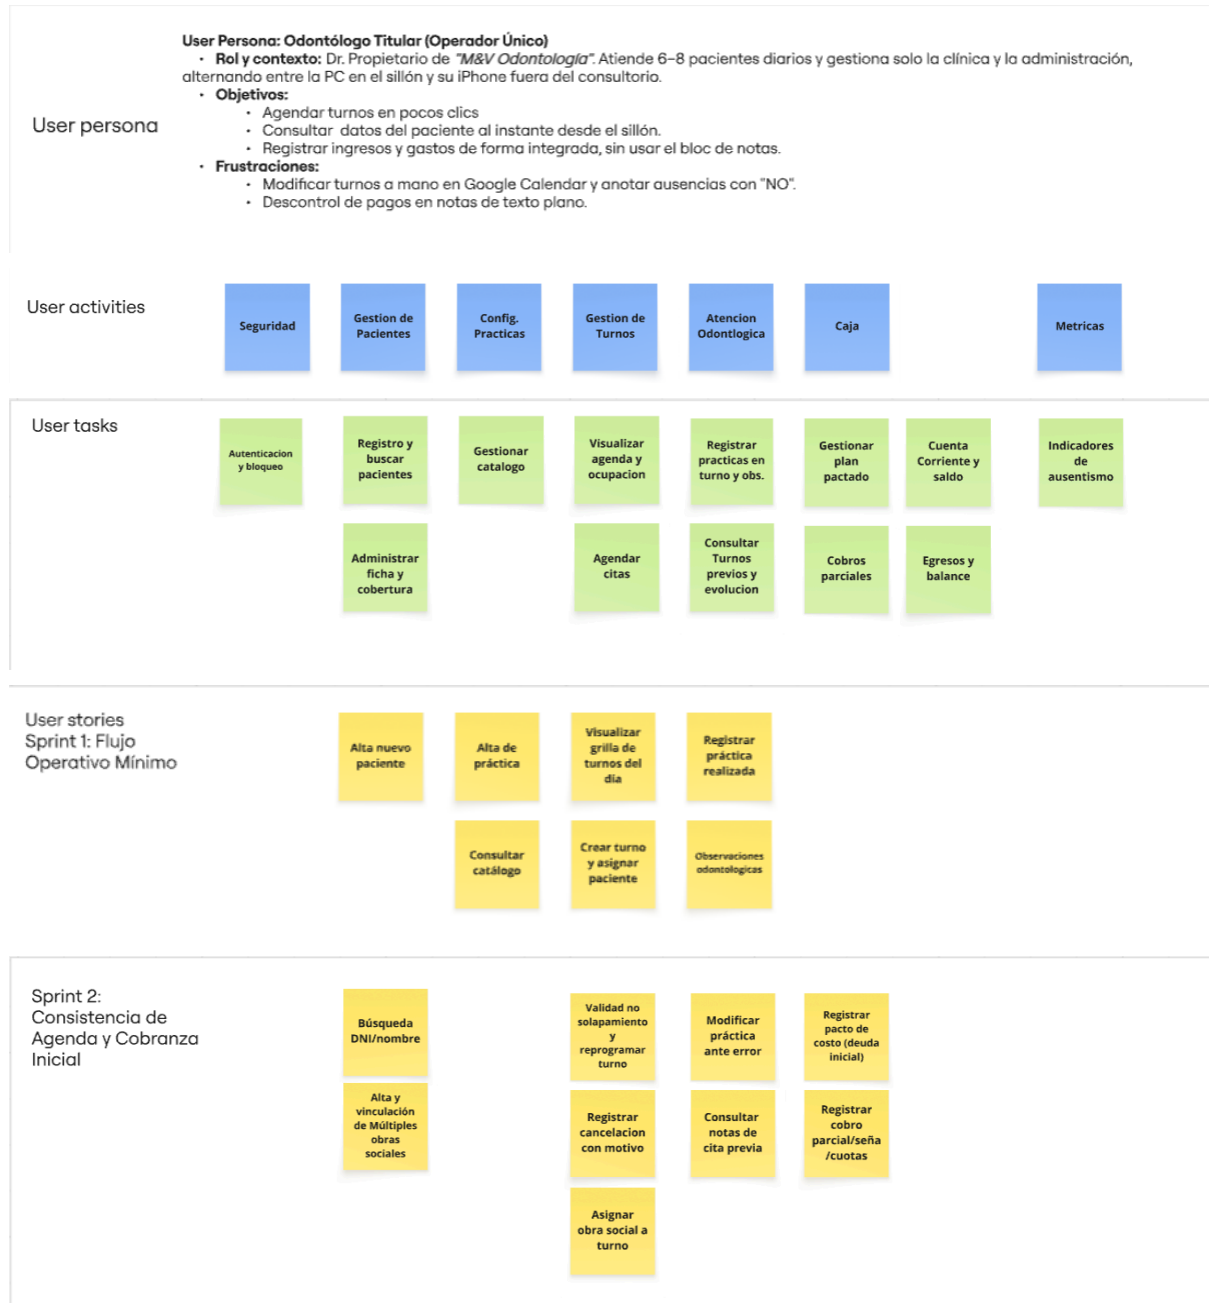

Sprint 3: Producto mínimo y viable



Sprint 4: Mantenimiento, Gastos y Calendario Visual



Sprint 5: Atajos por Voz y Métricas de Gestión



Descripción de la planificación de cada sprint:

Sprint 1: Flujo Operativo y Atención Básica

Implementa el circuito mínimo sin papel: alta de paciente, catálogo base de prácticas, asignación de turnos en panel diario y registro de la atención en sillón con notas clínicas.

Sprint 2: Agenda Validada y Cobro Inicial

Evita solapamientos de turnos, gestiona cancelaciones/reprogramaciones y asigna obras sociales. Incorpora el registro del costo pactado del tratamiento y cobros flexibles (parciales, señas o cuotas con tarjeta).

Sprint 3: Seguridad y Cuenta Corriente

Cierra el producto mínimo viable: acceso protegido por PIN, historial clínico de atenciones previas, visualización rápida de saldo, auditoría detallada de cuenta corriente y el mantenimiento (edición y bajas lógicas) de pacientes y prácticas

Sprint 4: Calendario Visual y Gestión de Egresos

Suma comodidad con la vista de agenda semanal/mensual y semáforo de ocupación por colores. Habilita la carga de gastos del consultorio (insumos, servicios).

Sprint 5: Carga por Voz, Bloqueo y Métricas

Agrega atajos de productividad: dictado de turnos por audio con borrador, bloqueo de sesión por inactividad, filtros avanzados de citas e indicadores de ausentismo y balance periódico de caja.

Historial de cambios

Fecha	Versión	Modificación
29/08/2026	0.1	Creación del documento
31/08/2026	0.2	Definición de product Backlog inicial
02/09/2026	0.3	Modificación de versiones de herramientas de código y capacitación del equipo Definición de frameworks y librerías con sus versiones y descripción
05/09/2026	0.4	Redefinición de product backlog por requerimientos modificados
06/09/2026	0.5	Definición del User Story Map
07/09/2026	0.6	Corrección y redefinición de story map. División de US en sprints en vez de release
08/09/2026	0.7	Actualización de capacitación del equipo y corrección de inconsistencia presente en product backlog
10/09/2026	0.8	Reescritura del propósito del documento
12/09/2026	0.9	Redefinición de historias de usuario de product backlog y modificación story map, módulos de cobro y actualización de prioridad
